

B 309, Steyrer Straße A 1 – HEUBERG




(Abb.: Bauarbeiten im Bereich der Grünbrücke I (Friedl))

Baufortschrittsbericht 3. Quartal 2009

Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan!

- Der Kreisverkehr auf der alten B 1 sowie der neuen Volkersdorfer Straße wurde termingerecht fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben.
- Ca. 90 % der Aufforstungen wurden bereits durchgeführt.
- Rund 1,6 km der insgesamt 3,15 km langen Moosbachrenaturierung wurden bereits im Bereich von Hargelsberg und Thann errichtet.
- Die Überführung Pfaffenwimmer wurde termingerecht fertig gestellt.
- Die Anbindung Harr Straße in Richtung Anschlussstelle Kronstorf wurde bereits errichtet.
- Fertigstellung Ableitungskanal Pfaffenwimmer (1.500 m).
- Die Asphaltierung der bituminösen Tragschichte auf der Haupttrasse im Bereich zwischen Hargelsberg und Kronstorf auf einer Länge von rund 2,5 km wurde bereits durchgeführt.

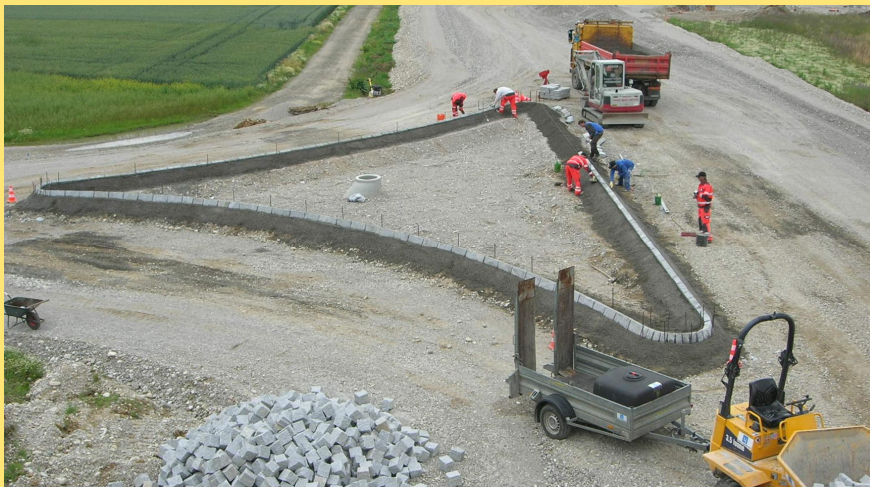

(Abb.: Versetzen von Leistensteinen im Bereich des Anschlusses Hargelsberg Nord)

90 % der Haupttrasse sind bereits in Bau!



(Abb.: Blick über die Trasse im Bereich Güterweg Hochholzergut)

Bereits durchgeführte Leistungen Straßenbau

■ Oberboden abtragen	140.000 m ³
■ Abtrag Boden	270.000 m ³
■ Bodenauswechslungen	10.000 m ³
■ Dammkörper schütten	350.000 m ³
■ Lärmschutzwälle	60.000 m ³
■ Leerrohrpaket	5.500 lfm
■ Bituminöse Tragschichten	32.000 m ²
■ Deckschichte (Kreisverkehr)	2.000 m ²
■ Leitschienen	350 lfm

Anstehende Straßenbauarbeiten

- Fertigstellung des Anschlusses Hargelsberg (voraussichtlich Ende Sommer 2009) und der Harr Straße bis „Hart“ mit anschließender Verkehrsfreigabe
- Rückhaltebecken (laufend entsprechend dem Baufortschritt)
- Böschungsbegrünungen (laufend entsprechend dem Baufortschritt)
- Wirtschaftswege im Bereich Stadtkirchen/Asang (Sommer 2009)
- Wirtschaftswege im Bereich Rabenberg (Sommer 2009)
- Nebenanlagen im Bereich Heuberg (Sommer 2009)

Leistungen Brückenbau

Rund 8,9 Mio. Euro wurden bisher umgesetzt, das entspricht in etwa 62 % der Auftragssumme.

Von den 23 ausgeschriebenen Objekten sind nachstehende 19 Bauwerke in Bau bzw. bis auf kleinere Restarbeiten fertig.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ■ Kristeinerbachbrücke | ■ Stallbachbrücke (Nebenobjekt) |
| ■ Kristeinerbachbrücke Zuf. Eckmayr | ■ Wilddurchlass Pirchhorner Nord |
| ■ Unterführung Anschluss Volkersdorf | ■ Wilddurchlass Pirchhorner Süd |
| ■ Grünbrücke Friedl | ■ Wilddurchlass Neuwald |
| ■ Grünbrücke Fördermayr | ■ Wilddurchlass Kronstorfberger Nord |
| ■ Moosbachdurchlass | ■ Wilddurchlass Kronstorfberger Süd |
| ■ Grünbrücke Metz | ■ Überführung Anschluss Kronstorf |
| ■ Wildstahlrohrdurchlass | ■ Wilddurchlass Riedlschacher Nord |
| ■ Überführung Anschluss Hargelsberg | ■ Wilddurchlass Riedlschacher Süd |
| ■ Überführung Anschluss Pfaffenwimmer | |

Zusätzlich zu den 23 Brücken werden noch 2 weitere Objekte errichtet:

- Auf Wunsch und auf Kosten der Marktgemeinde Kronstorf wird die Unterführung Stallbachstraße errichtet - erforderlich für die Betriebsansiedelung von Google. Fertigstellung Ende 2009.
- Auf Wunsch und auf Kosten der Fa. Bernegger wird eine Unterführung unter der B 309 zur Anbindung einer neuen Kiesgewinnungsanlage an das öffentliche Straßennetz errichtet. Fertigstellung Herbst 2009.



(Abb.: Unterführung Anschluss Volkersdorf)

Vorschau bis Jahresende 2009

Folgende Objekte werden noch heuer begonnen und zum Teil fertig gestellt:

- Hochwasserdurchlass Eckmayr
- Unterführung Güterweg Hochholzergut
- Wilddurchlass
- Unterführung Anschluss Heuberg

Die elektrotechnischen Arbeiten für die Grünbrücken Metz und Födermayr sind bereits ausgeschrieben und werden noch heuer vergeben.



(Abb.: Arbeiten im Bereich der Grünbrücke I (Friedl))

Anschlussstelle Enns-West – ASFINAG

Die Anschlussstelle Enns-West wird gemeinsam mit der ASFINAG errichtet und beinhaltet unter anderem den Neubau, die Verbreiterung und den Abtrag einer Brücke.

Die Vergabe der Bauarbeiten ist bereits an die Firma Kostmann erfolgt.

Der Baubeginn ist für Anfang August 2009 geplant.

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,

Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,

E-Mail: baun.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>

Redaktion: Evelyn Kroiß

Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau – Brücken- und Tunnelbau

Auflage; Datum: Juli 2009

DVR: 0069264
